ADIYAMAN BELEDİYESİ

YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

EKİM - 2019

ADIYAMAN BELEDİYESİ

DÖNEM YATIRIM İZLEME İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	13
Toplam Proje Bedeli (TL)	43.501.109,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	12.310.635,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	31.190.474,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	16.584.874,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	%66,42
Fiziki Gerçekleşme (%)	%78
Başlamayan Proje Sayısı (Sözleşme Aşamasında)	0
Devam Eden Proje Sayısı	9
Biten Proje Sayısı	4

ADIYAMAN BELEDİYESİ

YOL ALTYAPISI VE BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**13.515.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	6.386.000,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	7.129.000,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	1.517.227,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	%58
Fiziki Gerçekleşme (%)	%58
Yapım Durumu	Devam Ediyor



KENT PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2017
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**4.051.356,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	4.051.356,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	1.392.400,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	%34
Fiziki Gerçekleşme (%)	%34
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

ATATÜRK BULVARI ORTA REFÜJ VE ŞEHRİN MUHTELİF YEŞİL ALANLARINA OTOMATİK SULAMA TESİSATI DÖŞEME İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**1.000.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	1.000.000,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	740.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	%74
Fiziki Gerçekleşme (%)	%74
Yapım Durumu	Devam Ediyor



OTURAKÇILAR ÇARŞISI RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ	
Sektör	D.K.H-SOSYAL
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**327.450,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	327.450,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	0,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	%0
Fiziki Gerçekleşme (%)	%0
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BETON VE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**5.140.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.627.918,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	3.512.082,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	2.029.012,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 71
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 71
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACA VE IZGARA YÜKSELTME İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**571.120,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	168.740,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	402.380,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	**309.160,00 TL**
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 84
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 84
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

MUHTELİF ÇAPLARDA İÇME SUYU VE KANALİZASYON DÖŞEME 3. KISIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**2.872.891,91 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	2.872.892,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	2.693.187,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 94
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 94
Yapım Durumu	Devam Ediyor



EVSEL ABONE BAĞLANTISI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**984.120,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	174.120,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	810.000,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	508.213,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 69
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 69
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

EĞRİÇAĞI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**3.689.640,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	3.689.640,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	0,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 0
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 24
Yapım Durumu	Devam Ediyor




ADIYAMAN BELEDİYESİ

ABDULHAMİT HAN GENÇLİK VE KÜLTÜR EVİ YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**3.745.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	786.000,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	2.959.000,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	2.959.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	**%100**
Fiziki Gerçekleşme (%)	**%100**
Yapım Durumu	**BİTTİ**



ADIYAMAN BELEDİYESİ

KARAYOLLARI LOJMAN YAPIM İŞİ	
Sektör	Konut
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**2.530.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	869.188,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	1.660.812,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	1.660.812,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	**%100**
Fiziki Gerçekleşme (%)	**%100**
Yapım Durumu	**BİTTİ**

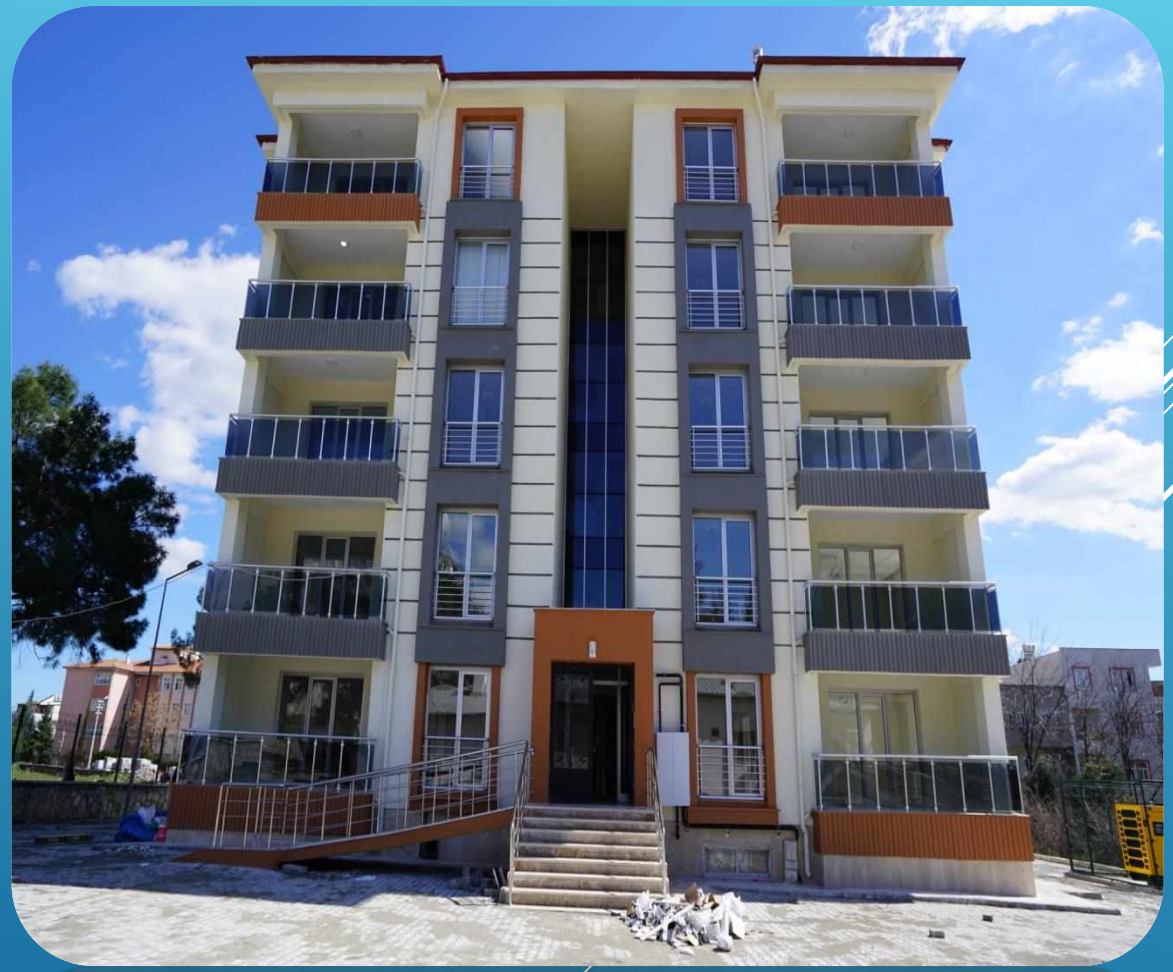

ADIYAMAN BELEDİYESİ

MUHTELİF PARKLARIN TADİLAT VE YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**1.862.000,00 TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	755.200,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	1.106.800,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	1.106.800,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	**%100**
Fiziki Gerçekleşme (%)	**%100**
Yapım Durumu	**BİTTİ**



ADIYAMAN BELEDİYESİ

MUHTELİF ÇAPLARDA İÇME SUYU VE KANALİZASYON DÖŞEME 2. KISIM İŞİ	
Sektör	D.K.H.
Proje Yeri	Adıyaman
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	**3.212.532,00.TL**
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.543.469,00 TL
Yıl Ödeneği (TL)	1.669.063,00 TL
Dönem Harcaması (TL)	1.669.063,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 100
Fiziki Gerçekleşme (%)	**% 100**
Yapım Durumu	**BİTTİ**



YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankası tarafından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe ile şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirmesine kafi gelmemektedir.

Bu sebepten dolayı yatırımlarla ilgili belediyemizin sadece ödenek sorunu bulunmaktadır.
