YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

ARALIK - 2019

DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	25
Toplam Proje Bedeli (TL)	62.668.017
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	14.247.923
Yıl Ödeneği (TL)	48.420.094
Dönem Harcaması (TL)	32.804.940
Nakdi Gerçekleşme (%)	75,08
Fiziki Gerçekleşme (%)	78,11
Başlamayan Proje Sayısı	2 + 1 Tasfiye
Devam Eden Proje Sayısı	8
Biten Proje Sayısı	14

ŞEHİR İÇMESUYU ŞEBEKESİ ANA TAŞIYICI HAT HDPE BORU ALIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	1.652.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	-
Yıl Ödeneği (TL)	1.652.000
Dönem Harcaması (TL)	1.652.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



RENKLİ PREFABRİK BETON BORDÜR VE PARKE ALIM İŞİ 2	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	392.742
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	392.742
Dönem Harcaması (TL)	392.742
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



ZEY KONKASÖR TAŞ OCAĞI PATLATMA İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.208.320
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	1.208.320
Dönem Harcaması (TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	10,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor

ADIYAMAN
BELEDİYESİ

YENİ MAHALLES GENÇLİK SPOR TESİSİ BAKIM ONARIM MAZLEME BOYA ALIMI

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	336.300
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	336.300
Dönem Harcaması (TL)	336.300
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



RENKLİ PREFABRİK BETON BORDÜR VE PARKE ALIM İŞİ 1

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Proje Bedeli (TL)	811.867
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	399.032
Yıl Ödeneği (TL)	412.835
Dönem Harcaması (TL)	412.835
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



MUHTELİF ÇAPLARDA BORU SEFERO, KAPAK VE EK PARÇA ALIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	880.988
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	880.988
Dönem Harcaması (TL)	499.981
Nakdi Gerçekleşme (%)	56,75
Fiziki Gerçekleşme (%)	56,75
Yapım Durumu	Devam Ediyor



KANALİZASYON DÖŞEME İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	3.271.480
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	-
Yıl Ödeneği (TL)	3.271.480
Dönem Harcaması (TL)	YENİ BAŞLADI
Nakdi Gerçekleşme (%)	YENİ BAŞLADI
Fiziki Gerçekleşme (%)	10,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor



MİLLET CADDESİ TOPRAKLAMA DUVAR YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MİLLET CADDESİ
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.742.012
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	1.742.012
Dönem Harcaması (TL)	YENİ BAŞLADI
Nakdi Gerçekleşme (%)	YENİ BAŞLADI
Fiziki Gerçekleşme (%)	10,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

KENT MERKEZİ MUHTELİF SOKAKLAR PLENT-MİKS BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	7.991.550
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	7.991.550
Dönem Harcaması (TL)	1.698.054
Nakdi Gerçekleşme (%)	21,25
Fiziki Gerçekleşme (%)	21,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

ATATÜRK BULVARI ORTA REFÜJ VE ŞEHRİN MUHTELİF YEŞİL ALANLARINA OTOMATİK SULAMA TESİSATI DEÖEŞEME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	1.189.853
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	1.189.853
Dönem Harcaması (TL)	1.189.853
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



ADIYAMAN BELEDİYESİ


ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BETON VE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	5.102.258
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.627.918
Yıl Ödeneği (TL)	3.474.340
Dönem Harcaması (TL)	3.474,340
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACA VE IZGARA YÜKSELTME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	571.120
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	168.740
Yıl Ödeneği (TL)	402.380
Dönem Harcaması (TL)	309.160
Nakdi Gerçekleşme (%)	83,68
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor



MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE KANALİZASYON DÖŞEME 3. KISIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	2.959.885
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	2.959.885
Dönem Harcaması (TL)	2.959.885
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti

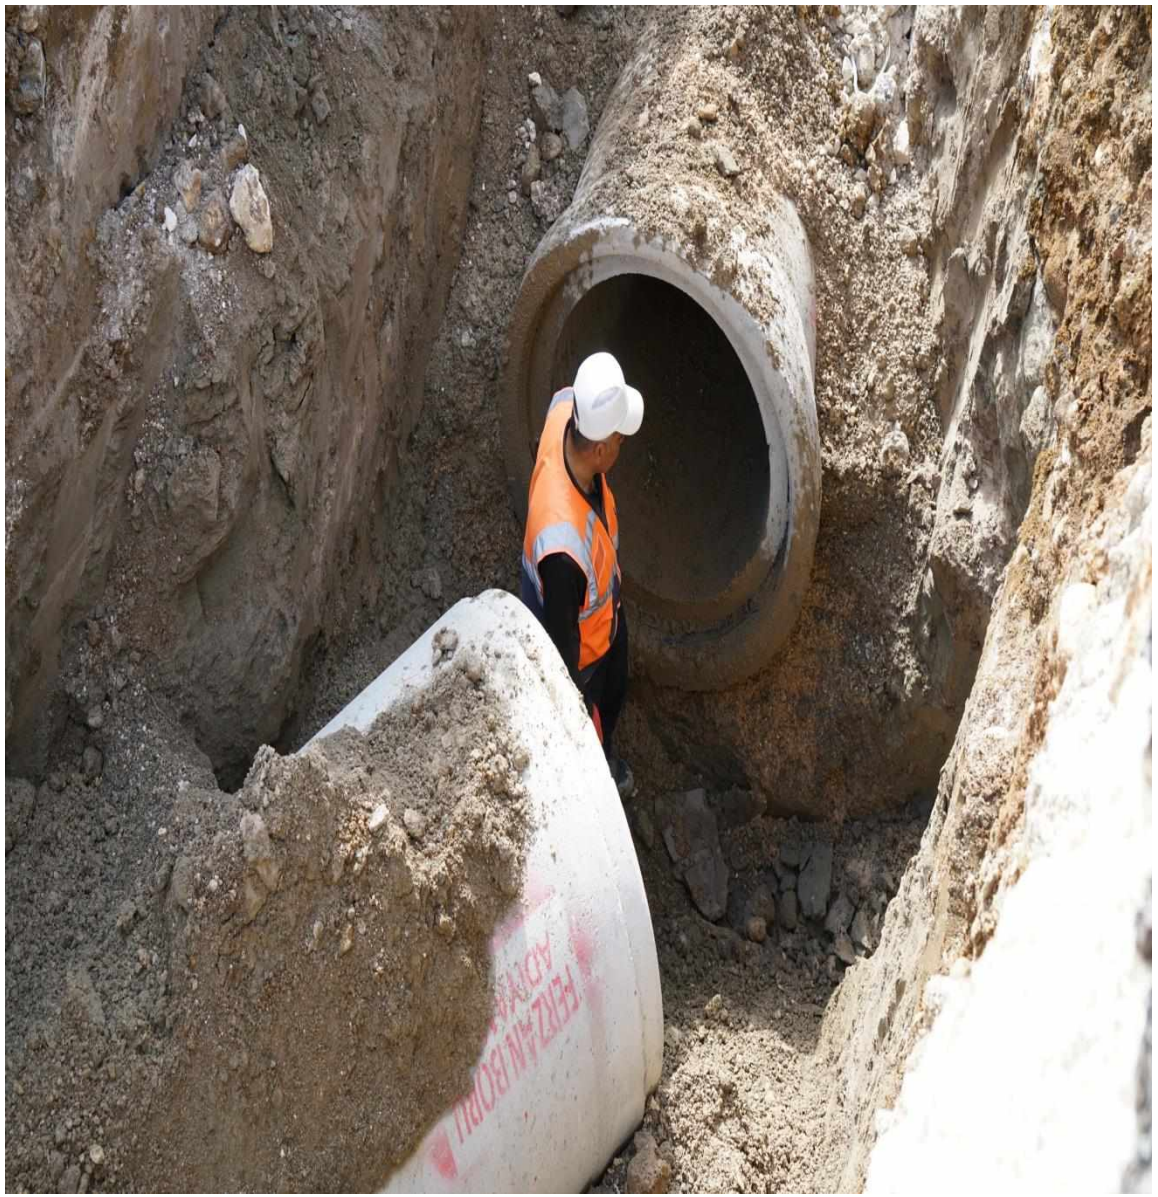

ADIYAMAN BELEDİYESİ

EVSEL ABONE BAĞLANTI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	984.120
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	174.120
Yıl Ödeneği (TL)	810.000
Dönem Harcaması (TL)	446.901
Nakdi Gerçekleşme (%)	63,10
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

EĞRİÇAYI KANALİZASYON KOLLEK TÖR HATTI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	EĞRİ ÇAYI PARKI
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	3.689.640
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	3.689.640
Dönem Harcaması (TL)	2.782.089
Nakdi Gerçekleşme (%)	75,40
Fiziki Gerçekleşme (%)	75,40
Yapım Durumu	Devam Ediyor



ADIYAMAN BELEDİYESİ

KÖMÜR BELEDİYESİ PARKE TAŞI BETON BORDÜR YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	KÖMÜR BELEDİYESİ
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	274.704
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	190.063
Yıl Ödeneği (TL)	274.704
Dönem Harcaması (TL)	84.482
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



YOL ALT YAPISI VE BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	ULAŞIM
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	13.515.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	6.386.000
Yıl Ödeneği (TL)	7.129.000
Dönem Harcaması (TL)	7.129.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



ADIYAMAN BELEDİYESİ

OTURAKÇILAR ÇARŞISI RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ	
Sektör	SOSYAL HİZMET
Proje Yeri	OTURAKÇILAR PAZARI
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	327.450
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	327.450
Dönem Harcaması (TL)	327.450
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



KENT PARKI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	YENİ MAHALLE
Başlama Yılı	2017
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	4.051.356
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	
Yıl Ödeneği (TL)	1.392.400
Dönem Harcaması (TL)	1.392.400
Nakdi Gerçekleşme (%)	34,37
Fiziki Gerçekleşme (%)	34,00
Yapım Durumu	İŞ TERKİ




ADIYAMAN BELEDİYESİ

ABDÜLHAMİT HAN GENÇLİK VE KÜLTÜR EVİ YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	YENİ MAHALLE
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	3.475.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	786.000
Yıl Ödeneği (TL)	2.959.000
Dönem Harcaması (TL)	2.959.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



KARAYOLLARI LOJMAN YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	BULVAR CAD.
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	2.530.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	869.188
Yıl Ödeneği (TL)	1.660.812
Dönem Harcaması (TL)	1.660.812
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti

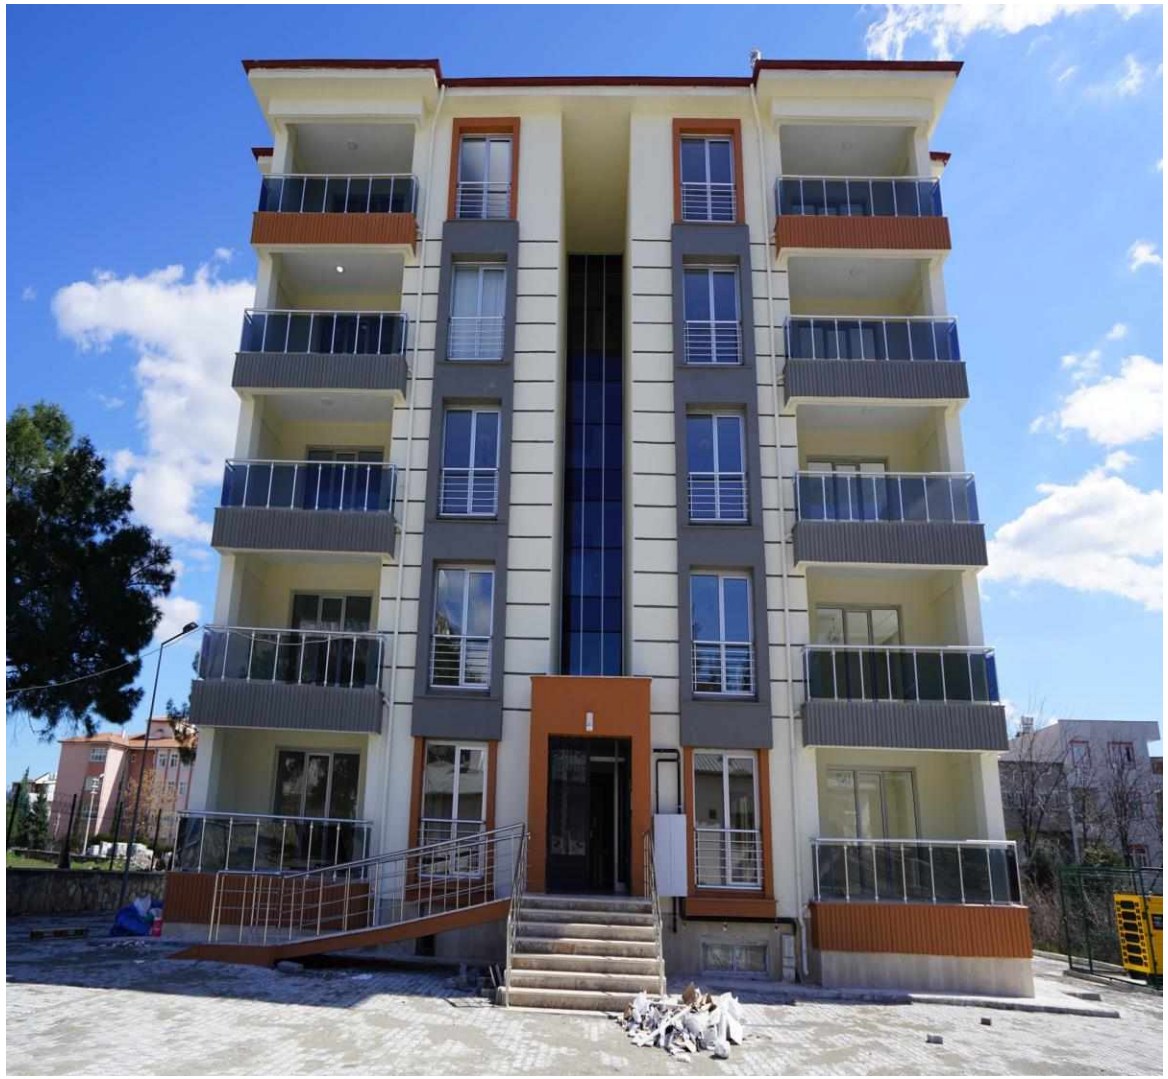

ADIYAMAN BELEDİYESİ

MUHTELİF PARKLARIN TADİLAT VE YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	2.227.998
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	755.200
Yıl Ödeneği (TL)	1.472.798
Dönem Harcaması (TL)	1.472.798
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE KANALİZASYON DÖŞEME 2. KISIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	MUHTELİF YERLER
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	3.212.532
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.543.469
Yıl Ödeneği (TL)	1.669.063
Dönem Harcaması (TL)	1.669.063
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00
Yapım Durumu	Bitti



YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
