YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

TEMMUZ 2020


DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	11
Toplam Proje Bedeli (TL)	30.771.330
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	6.079.045
Yıl Ödeneği (TL)	24.692.285
Dönem Harcaması (TL)	6.511.742
Nakdi Gerçekleşme (%)	40,92%
Fiziki Gerçekleşme (%)	55,05%
Başlamayan Proje Sayısı	0
Devam Eden Proje Sayısı	9
Biten Proje Sayısı	2

(2020_03) ZEY KONKASÖR TAŞ OCAĞI PATLATMA İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.208.320
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	1.208.320
Dönem Harcaması (TL)	839.782
Nakdi Gerçekleşme (%)	69,50%
Fiziki Gerçekleşme (%)	69,50%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_01) MUHTELİF CADDE VE SOKAK KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	3.644.394
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	3.644.394
Dönem Harcaması (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

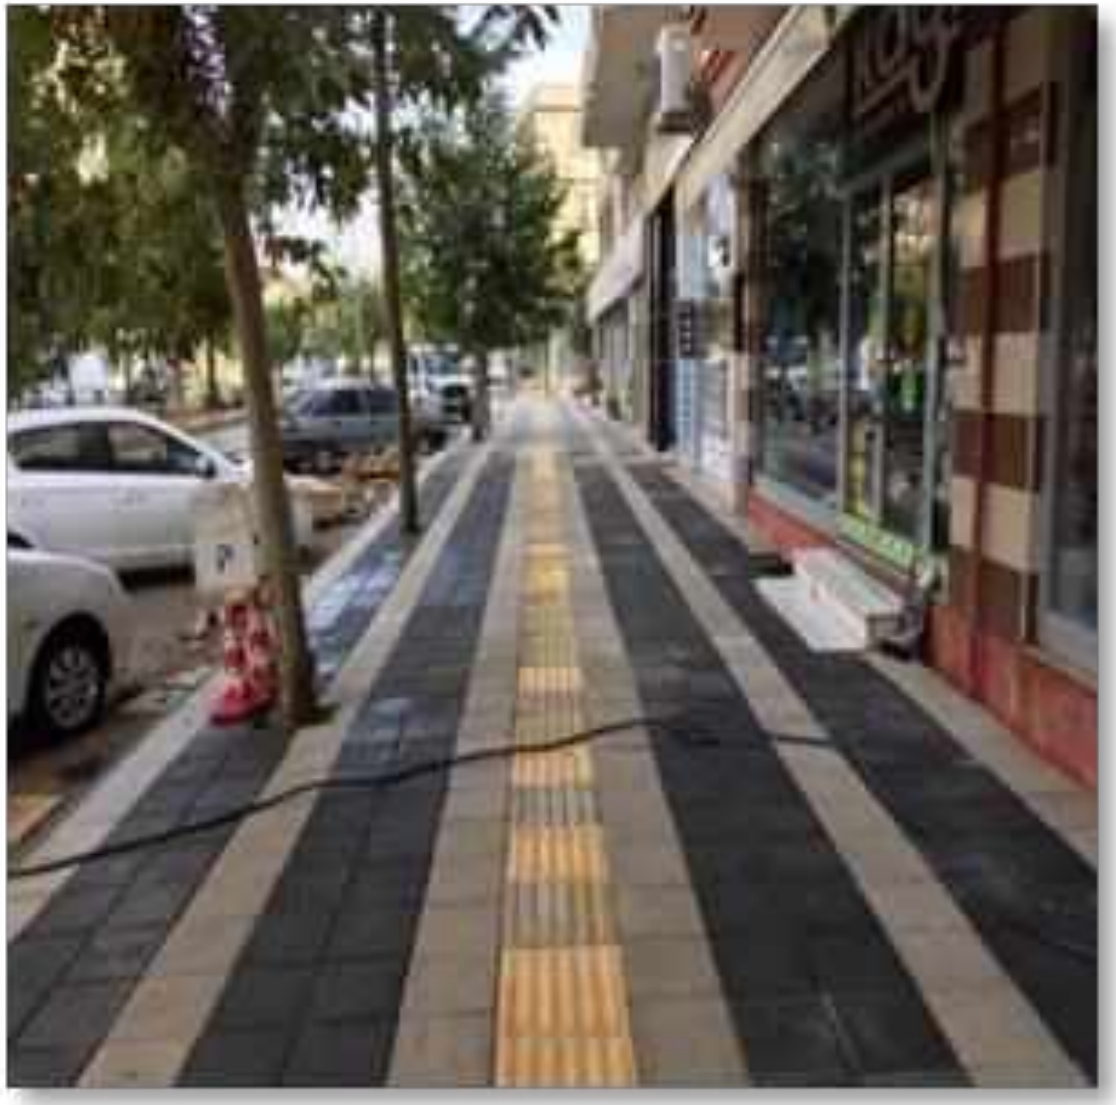

(2020_02) ADIYAMAN OTURAKÇILAR ÇARŞISI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	5.313.502
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	5.313.502
Dönem Harcaması (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_05) KANALİZASYON İNŞAATI DÖŞEME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	3.271.480
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	3.271.480
Dönem Harcaması (TL)	1.670.145
Nakdi Gerçekleşme (%)	51,05%
Fiziki Gerçekleşme (%)	51,05%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_06) MİLLET CADDESİ TOPRAKARME DUVAR VE MENFEZ YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.742.012
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	1.742.012
Dönem Harcaması (TL)	1.131.348
Nakdi Gerçekleşme (%)	64,94%
Fiziki Gerçekleşme (%)	64,94%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_04) MUHTELİF ÇAPLARDA BORU SEFERO KAPAK VE EK PARÇA ALIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.020.940
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	499.981
Yıl Ödeneği (TL)	520.959
Dönem Harcaması (TL)	520.959
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_07) KENT MERKEZİ MUHTELİF CADDE SOKAK PLENT MİKS TEMEL VE BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	7.991.550
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.698.054
Yıl Ödeneği (TL)	6.293.496
Dönem Harcaması (TL)	1.503.865
Nakdi Gerçekleşme (%)	40,07%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,07%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_09) EVSEL ABONE BAĞLANTISI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	984.120
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	621.021
Yıl Ödeneği (TL)	363.099
Dönem Harcaması (TL)	135.171
Nakdi Gerçekleşme (%)	76,84%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Devam ediyor



(2020_10) EĞRİÇAYI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIMI	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	3.689.640
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.782.089
Yıl Ödeneği (TL)	907.551
Dönem Harcaması (TL)	539.136
Nakdi Gerçekleşme (%)	90,01%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Devam ediyor



(2020_08) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACA IZGARA YÜKSELTME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	649.236
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	477.900
Yıl Ödeneği (TL)	171.336
Dönem Harcaması (TL)	171.336
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_11) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.256.137
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	1.256.137
Dönem Harcaması (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
