YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

ARALIK 2020


DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	23
Toplam Proje Bedeli (TL)	121.545.305
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	6.079.045
Yıl Ödeneği (TL)	114.667.105
Dönem Harcaması (TL)	33.054.344
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Başlamayan Proje Sayısı	0
Devam Eden Proje Sayısı	7
Biten Proje Sayısı	16

(2020_03) ZEY KONKASÖR TAŞ OCAĞI PATLATMA İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.449.984
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	1.449.984
Dönem Harcaması (TL)	1.449.984
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2020_01) MUHTELİF CADDE VE SOKAK KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.300.385
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	4.300.385
Dönem Harcaması (TL)	2.736.827
Nakdi Gerçekleşme (%)	63,64%
Fiziki Gerçekleşme (%)	63,64%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

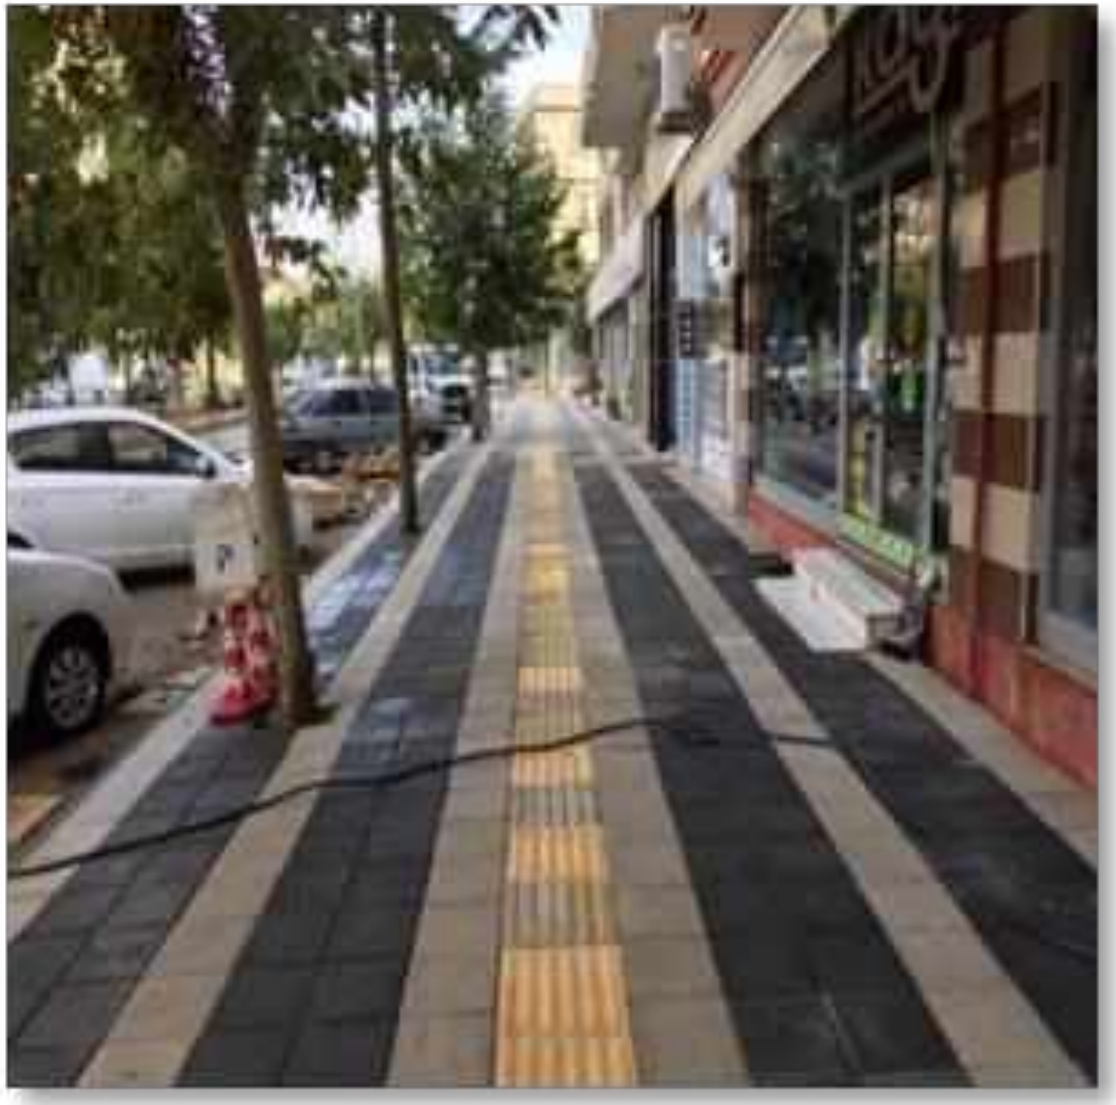

ADIYAMAN BELEDİYESİ

(2020_02) ADIYAMAN OTURAKÇILAR ÇARŞISI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	6.269.934
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	6.269.934
Dönem Harcaması (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	12,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_05) KANALİZASYON İNŞAATI DÖŞEME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	3.925.776
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	3.925.776
Dönem Harcaması (TL)	3.925.776
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_06) MİLLET CADDESİ TOPRAKARME DUVAR VE MENFEZ YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	2.090.415
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	2.090.415
Dönem Harcaması (TL)	2.090.415
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_04) MUHTELİF ÇAPLARDA BORU SEFERO KAPAK VE EK PARÇA ALIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	1.020.940
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	499.981
Yıl Ödeneği (TL)	520.959
Dönem Harcaması (TL)	520.959
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_07) KENT MERKEZİ MUHTELİF CADDE SOKAK PLENT MİKS TEMEL VE BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	8.790.705
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.698.054
Yıl Ödeneği (TL)	6.293.496
Dönem Harcaması (TL)	7.092.651
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_09) EVSEL ABONE BAĞLANTISI YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	1.081.222
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	621.021
Yıl Ödeneği (TL)	460.201
Dönem Harcaması (TL)	460.201
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_10) EĞRİÇAYI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIMI

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2019
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	3.689.640
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.782.089
Yıl Ödeneği (TL)	907.551
Dönem Harcaması (TL)	907.551
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_08) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACA IZGARA YÜKSELTME İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2019
Proje Bedeli (TL)	649.236
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	477.900
Yıl Ödeneği (TL)	171.336
Dönem Harcaması (TL)	171.336
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_11) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	1.486.141
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	1.486.141
Dönem Harcaması (TL)	1.486.141
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_12) 15 ADET SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.944.210
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	4.944.210
Dönem Harcaması (TL)	3.297.764
Nakdi Gerçekleşme (%)	66,70%
Fiziki Gerçekleşme (%)	66,70%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_13) KOMPOZİT YAĞMURSUYU IZGARASI ALIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	252.756
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	252.756
Dönem Harcaması (TL)	252.756
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_14) MUHTELİF YERLERDE KANALİZASYON YAĞMURSUYU, İÇMESUYU İNŞAAT İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.651.994
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	4.651.994
Dönem Harcaması (TL)	1.953.824
Nakdi Gerçekleşme (%)	42,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	42,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_15) TEMİZ VE PİS SU BORU VE EK PARÇA İLE FİTİNKS MALZEME ALIMI

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	264.910
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	264.910
Dönem Harcaması (TL)	264.910
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_16) KALDIRIM TİPİ ÇÖP SEPETİ METAL ÜRÜN ALIMI

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	97.350
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	97.350
Dönem Harcaması (TL)	97.350
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_17) ŞEHİRİÇİ İÇMESUYU ANA ŞEBEKE HATTINDA KULLANILMAK ÜZERE PE100 BORU ALIMI	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	224.200
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	224.200
Dönem Harcaması (TL)	224.200
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_18) 2020 YILI OYUN GRUBU ALIMI VE MONTAJ İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	342.194
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	342.194
Dönem Harcaması (TL)	342.194
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2020_19) 14 KALEM TRAFİK MALZEMESİ ALIMI	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	199.668
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	199.668
Dönem Harcaması (TL)	199.668
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2020_20) MADAD PROJESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRLEVİK İÇME SUYU İSALE HATTI VE 20.000 M3'LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli - 7.400.000 EURO (TL)	67.044.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği - 7.400.000 EURO (TL)	67.044.000
Dönem Harcaması (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_21) KANALİZASYON ŞEBEKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ÇAPLARDA SFERO KAPAK VE EK PARÇA ALIMI	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	2.080.600
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	2.080.600
Dönem Harcaması (TL)	1.812.722
Nakdi Gerçekleşme (%)	87,12%
Fiziki Gerçekleşme (%)	87,12%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2020_22) KENT PARK VE 10 ADET PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	5.854.984
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	5.854.984
Dönem Harcaması (TL)	2.933.053
Nakdi Gerçekleşme (%)	50,09%
Fiziki Gerçekleşme (%)	50,09%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_23) BAZALT KALDIRIM YAPIM İŞİ

Sektör	D.K.H
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2020
Proje Bedeli (TL)	834.063
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0
Yıl Ödeneği (TL)	834.063
Dönem Harcaması (TL)	834.063
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
