
YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

EKİM 2021

DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	19
Toplam Proje Bedeli (TL)	129.712.318
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	12.734.189
Yıl Ödeneği (TL)	116.978.129
Dönem Harcaması (TL)	24.163.931
Nakdi Gerçekleşme (%)	28,45%
Fiziki Gerçekleşme (%)	69,53%
Başlamayan Proje Sayısı	0
Devam Eden Proje Sayısı	12
Biten Proje Sayısı	7

(2020_01) MUHTELİF CADDE VE SOKAK KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.300.385,21
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.736.826,84
Yıl Ödeneği (TL)	1.563.558,37
Dönem Harcaması (TL)	681.877,91
Nakdi Gerçekleşme (%)	79,50%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

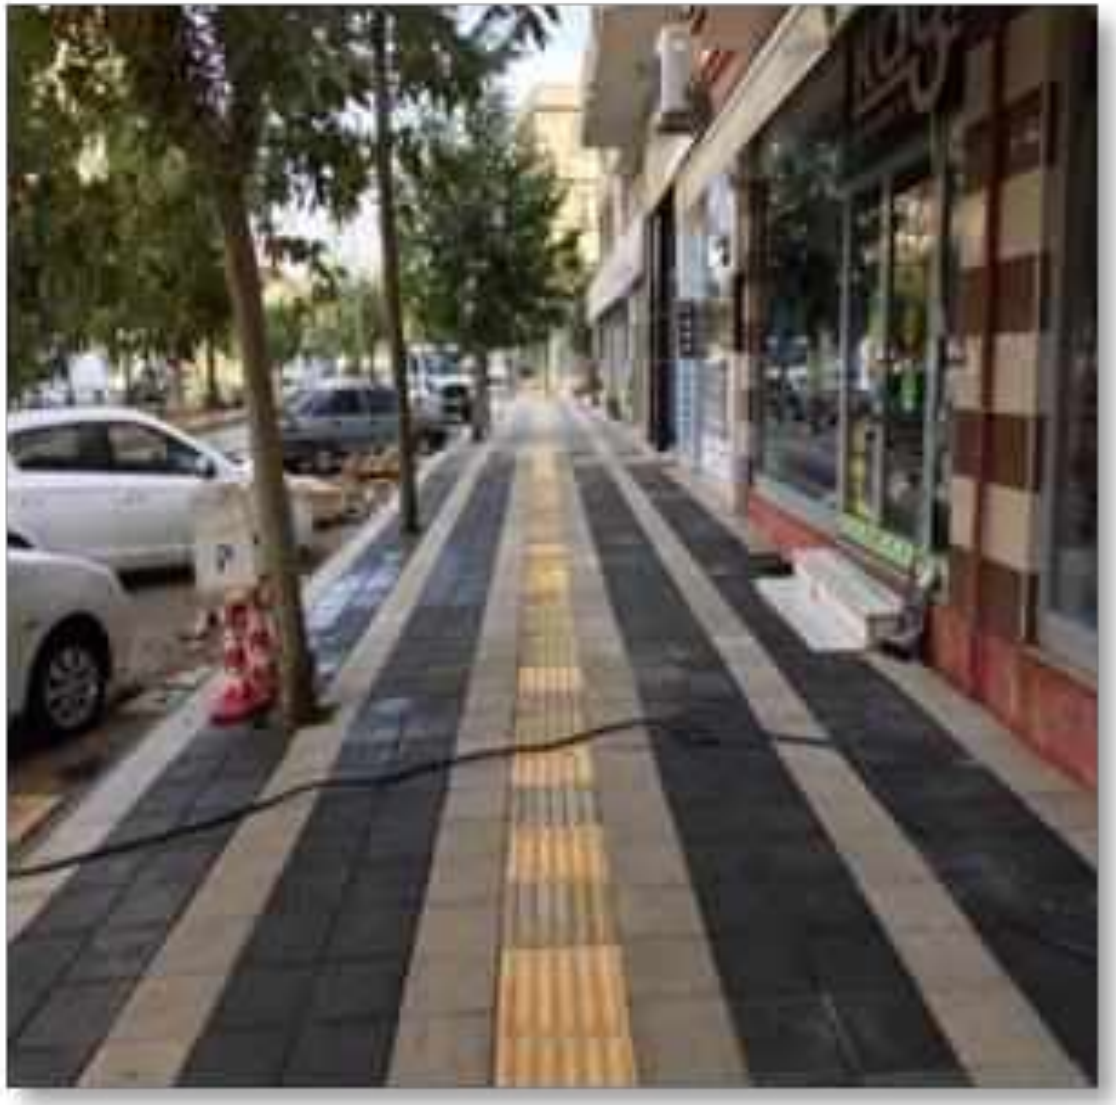

(2020_02) ADIYAMAN OTURAKÇILAR ÇARŞISI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	Turizm
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	6.269.933,53
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	6.269.933,53
Dönem Harcaması (TL)	2.968.207,42
Nakdi Gerçekleşme (%)	47,34%
Fiziki Gerçekleşme (%)	50,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2020_12) 15 ADET SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.944.209,79
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	3.297.763,91
Yıl Ödeneği (TL)	1.646.445,88
Dönem Harcaması (TL)	1.646.445,88
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti






(2020_14) MUHTELİF YERLERDE KANALİZASYON YAĞMURSUYU, İÇMESUYU İNŞAAT İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	4.651.994,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.953.823,99
Yıl Ödeneği (TL)	2.698.170,01
Dönem Harcaması (TL)	2.698.140,01
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_20) MADAD PROJESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRLEVİK İÇME SUYU İSALE HATTI VE 20.000 M3'LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli - 7.400.000 EURO (TL)	67.044.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği - 7.400.000 EURO (TL)	67.044.000,00
Dönem Harcaması (TL)	2.709.096,61
Nakdi Gerçekleşme (%)	4,04%
Fiziki Gerçekleşme (%)	10,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

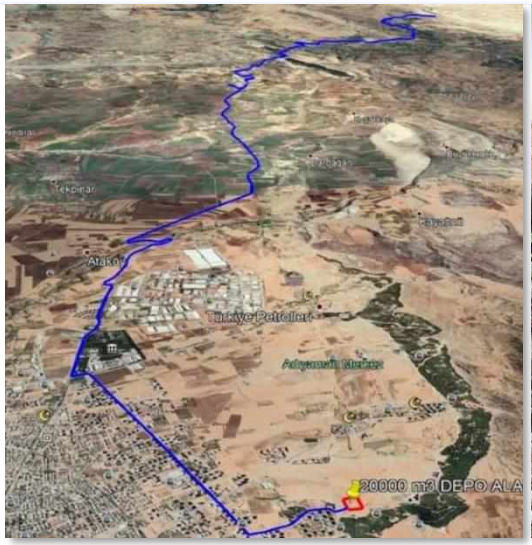





(2020_21) KANALİZASYON ŞEBEKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ÇAPLARDA SFERO KAPAK VE EK PARÇA ALIMI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	2.422.338,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.812.722,00
Yıl Ödeneği (TL)	609.616,00
Dönem Harcaması (TL)	609.616,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2020_22) KENT PARK VE 10 ADET PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	5.854.984,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.933.052,67
Yıl Ödeneği (TL)	2.921.931,33
Dönem Harcaması (TL)	2.653.501,43
Nakdi Gerçekleşme (%)	95,42%
Fiziki Gerçekleşme (%)	96,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2021_01) TAŞ OCAĞI PATLATMA İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	1.814.250,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	1.814.250,00
Dönem Harcaması (TL)	798.270,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	44,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	50,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor






(2021_02) ADIYAMAN GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	7.847.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	7.847.000,00
Dönem Harcaması (TL)	1.043.330,63
Nakdi Gerçekleşme (%)	13,30%
Fiziki Gerçekleşme (%)	25,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2021_03) KENT MERKEZİ MUHTELİF CADDE SOKAK PLENT MİKS TEMEL VE BETON ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	6.218.600,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	6.218.600,00
Dönem Harcaması (TL)	3.319.720,95
Nakdi Gerçekleşme (%)	53,38%
Fiziki Gerçekleşme (%)	60,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



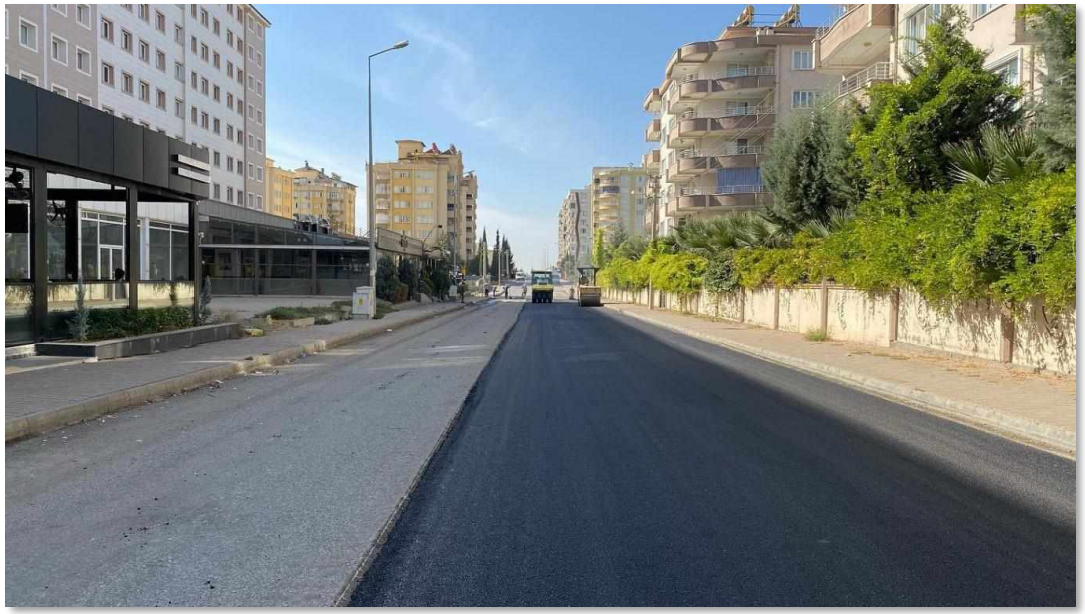

(2021_04) 1. KISIM MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İMALATI İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	4.960.460,75
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.960.460,75
Dönem Harcaması (TL)	1.120.740,78
Nakdi Gerçekleşme (%)	22,59%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2021_05) 2. KISIM MUHTELIF CADDE VE SOKAKLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İMALATI İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	5.666.181,68
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	5.666.181,68
Dönem Harcaması (TL)	1.537.436,11
Nakdi Gerçekleşme (%)	27,13%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor




(2021_06) ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞMUR SUYU IZGARALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇERÇEVESİZ KOMBİZİT YAĞMURSUYU IZGARASI ALIMI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	486.750,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	486.750,00
Dönem Harcaması (TL)	486.750,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_07) ADIYAMAN BELEDİYESİ HANGAR YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	305.922,27
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	305.922,27
Dönem Harcaması (TL)	305.922,27
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_08) KENT MERKEZİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	4.458.136,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.458.136,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	20,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

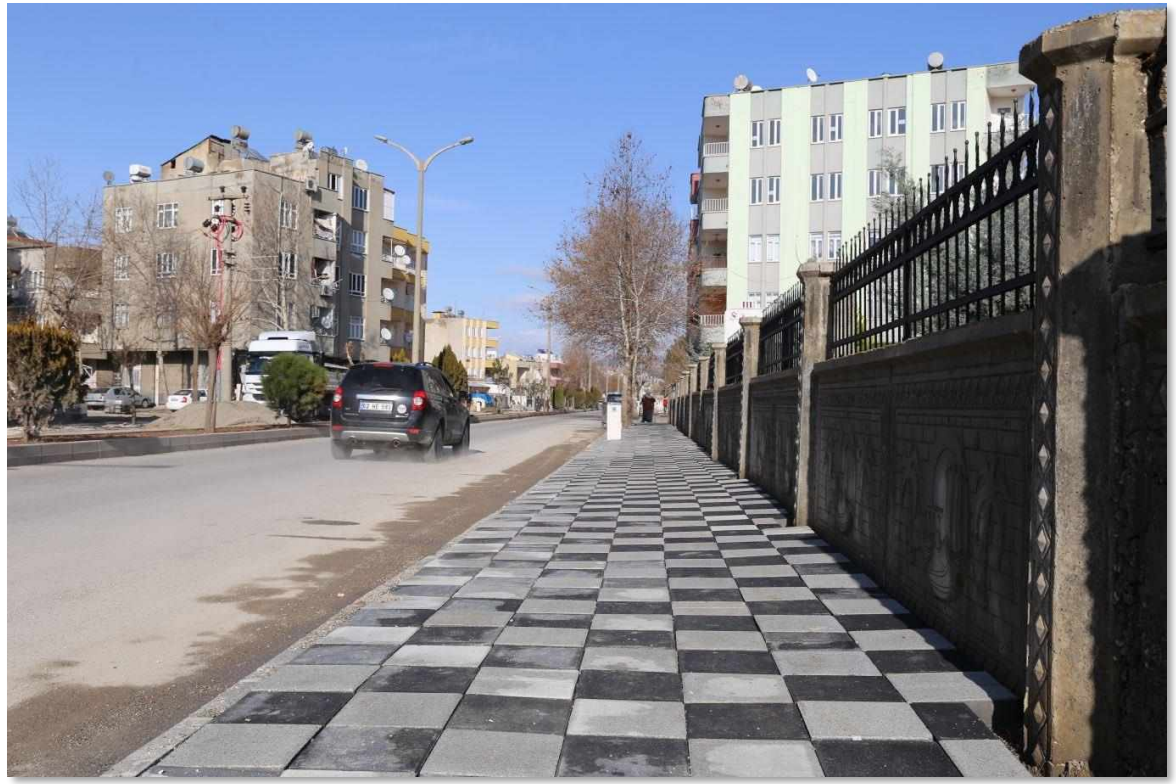

(2021_09) MUHTELİF YERLERDE BETONARME ÇEVRE DUVARI VE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	1.227.376,56
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	1.227.376,56
Dönem Harcaması (TL)	422.843,11
Nakdi Gerçekleşme (%)	34,45%
Fiziki Gerçekleşme (%)	50,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2021_10) ŞEHİR İÇMESUYU ŞEBEKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HDPE 800MM PN 10 HDPE 100 BORU ALIMI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	419.755,50
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	419.755,50
Dönem Harcaması (TL)	419.755,50
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_11) KANALIZASYON ŞEBEKESINDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ÇAPLARDA BORU KAPAK VE EK PARÇA ALIMI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	435.361,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	435.361,00
Dönem Harcaması (TL)	435.361,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_12) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLAR İÇİN KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR ALIM VE YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2021
Proje Bedeli (TL)	384.680,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	384.680,00
Dönem Harcaması (TL)	306.915,05
Nakdi Gerçekleşme (%)	79,78%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
