YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

TEMMUZ 2022

DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	21
Toplam Proje Bedeli (TL)	654.728.733
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	39.350.174
Yıl Ödeneği (TL)	615.378.559
Dönem Harcaması (TL)	81.289.389
Nakdi Gerçekleşme (%)	18,43%
Fiziki Gerçekleşme (%)	39,14%
Başlamayan Proje Sayısı	6
Devam Eden Proje Sayısı	11
Biten Proje Sayısı	3
Tasfiye Edilen Proje Sayısı	1

ADIYAMAN BELEDİYESİ

(2020_01) MUHTELİF CADDE VE SOKAK KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	4.300.385,21
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	3.475.358,40
Yıl Ödeneği (TL)	825.026,81
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	81,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi



ADIYAMAN BELEDİYESİ

(2020_02) ADIYAMAN OTURAKÇILAR ÇARŞISI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	Turizm
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	6.269.933,53
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.943.710,55
Yıl Ödeneği (TL)	3.326.222,98
Dönem Harcaması (TL)	886.098,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	61,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	65,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor







(2020_20) MADAD PROJESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRLEVİK İÇME SUYU İSALE HATTI VE 20.000 M3'LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli - 7.400.000 EURO (TL)	135.059.298,30
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	17.478.530,51
Yıl Ödeneği - 7.400.000 EURO (TL)	117.580.767,79
Dönem Harcaması (TL)	47.943.807,17
Nakdi Gerçekleşme (%)	48,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	50,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor







(2021_01) TAŞ OCAĞI PATLATMA İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	2.468.919,90
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.233.690,00
Yıl Ödeneği (TL)	1.235.229,90
Dönem Harcaması (TL)	1.022.188,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	91,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2021_02) ADIYAMAN GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ (ESKİ ŞİRE PAZARI)	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	10.161.747,28
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	3.369.929,68
Yıl Ödeneği (TL)	6.791.817,60
Dönem Harcaması (TL)	5.444.492,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	87,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	99,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor






(2021_04) 1. KISIM MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İMALATI İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	5.505.212,10
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	4.219.598,50
Yıl Ödeneği (TL)	1.285.613,60
Dönem Harcaması (TL)	1.285.613,60
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_05) 2. KISIM MUHTELIF CADDE VE SOKAKLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İMALATI İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	5.666.181,68
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	5.049.202,49
Yıl Ödeneği (TL)	616.979,19
Dönem Harcaması (TL)	609.886,33
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2021_08) KENT MERKEZİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA KALDIRIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	6.303.917,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.580.153,75
Yıl Ödeneği (TL)	4.723.763,25
Dönem Harcaması (TL)	3.223.175,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	76,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	45,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

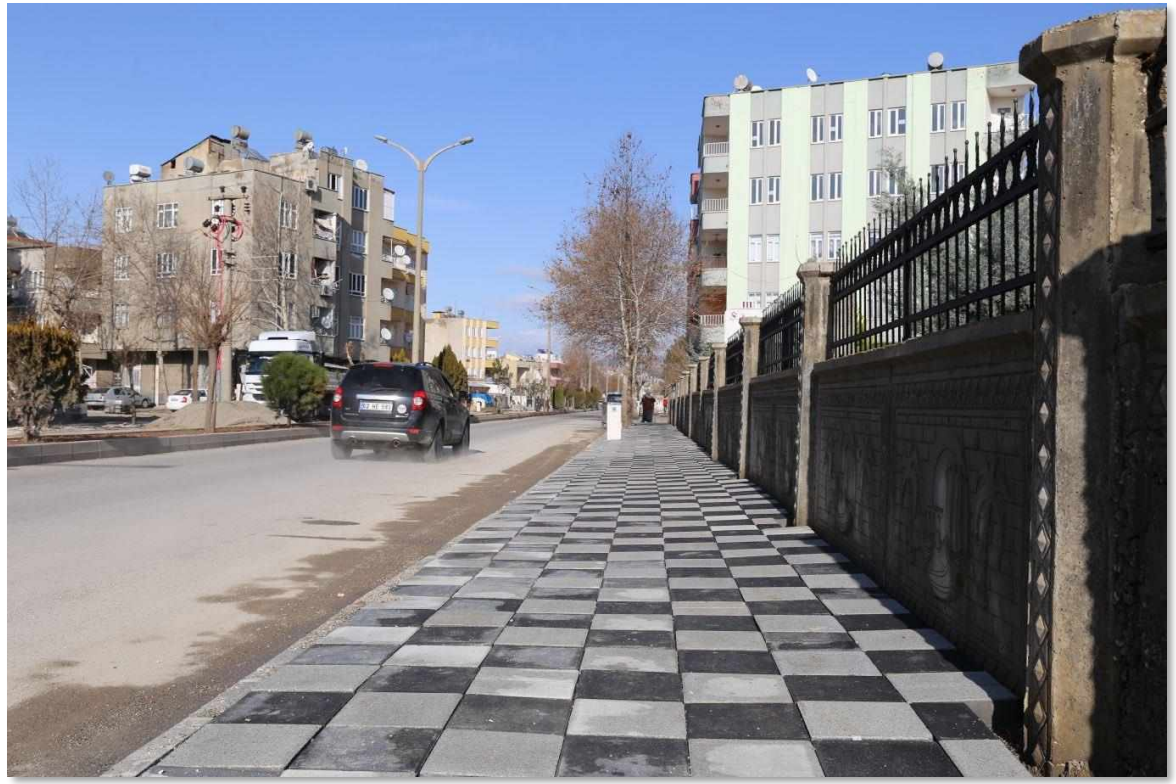

(2022_01) ADIYAMAN BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	88.051.600,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	88.051.600,00
Dönem Harcaması (TL)	15.486.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	18,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	20,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor




(2022_02) 240 TON ASFALT PLENT MAKİNESİ, İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA VE ASFALT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	4.012.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.012.000,00
Dönem Harcaması (TL)	1.280.727,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	32,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	35,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2022_03) AYAKKABI KENT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	28.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	28.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

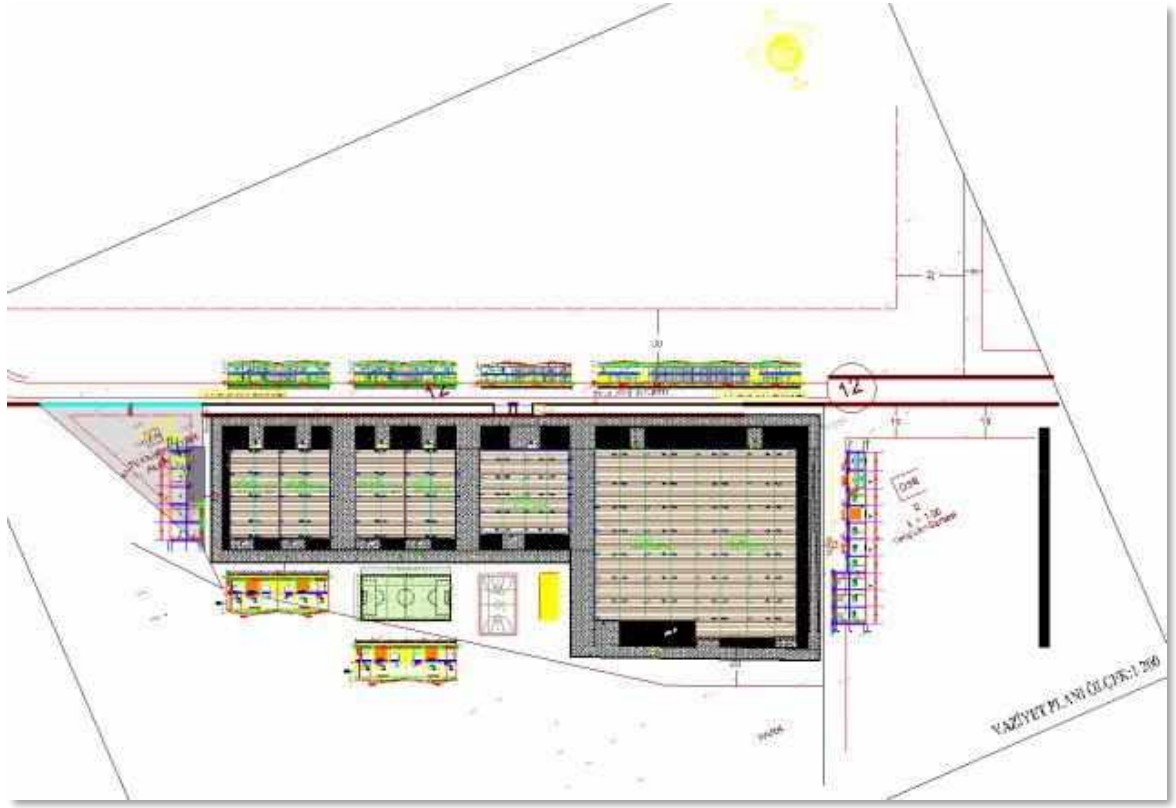

(2022_04) KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	236.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	236.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2022_05) HAYVAN PAZARI VE KESİMHANE YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	16.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	16.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2022_06) HAYVAN HASTANESİ VE GEÇİCİ HAYVAN BARINAĞI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	30.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	30.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2022_07) GÜNEY ÇEVRE YOLU VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	30.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	30.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında






(2022_08) MUHTARLAR KONFEDERASYON BİNASI VE MUHTAR EVLERİ (10 ADET) 1. ETAP	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	7.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	7.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2022_09) SOKAK SAGLIKLAŞTIRMA VE YOL KALDIRIM AYDINLATMA YAPIM İŞİ (GÖLEBATMAZ CD, BUHARA CD. VE SAĞLIK OCAĞI CD.)	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	8.274.160,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	8.274.160,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

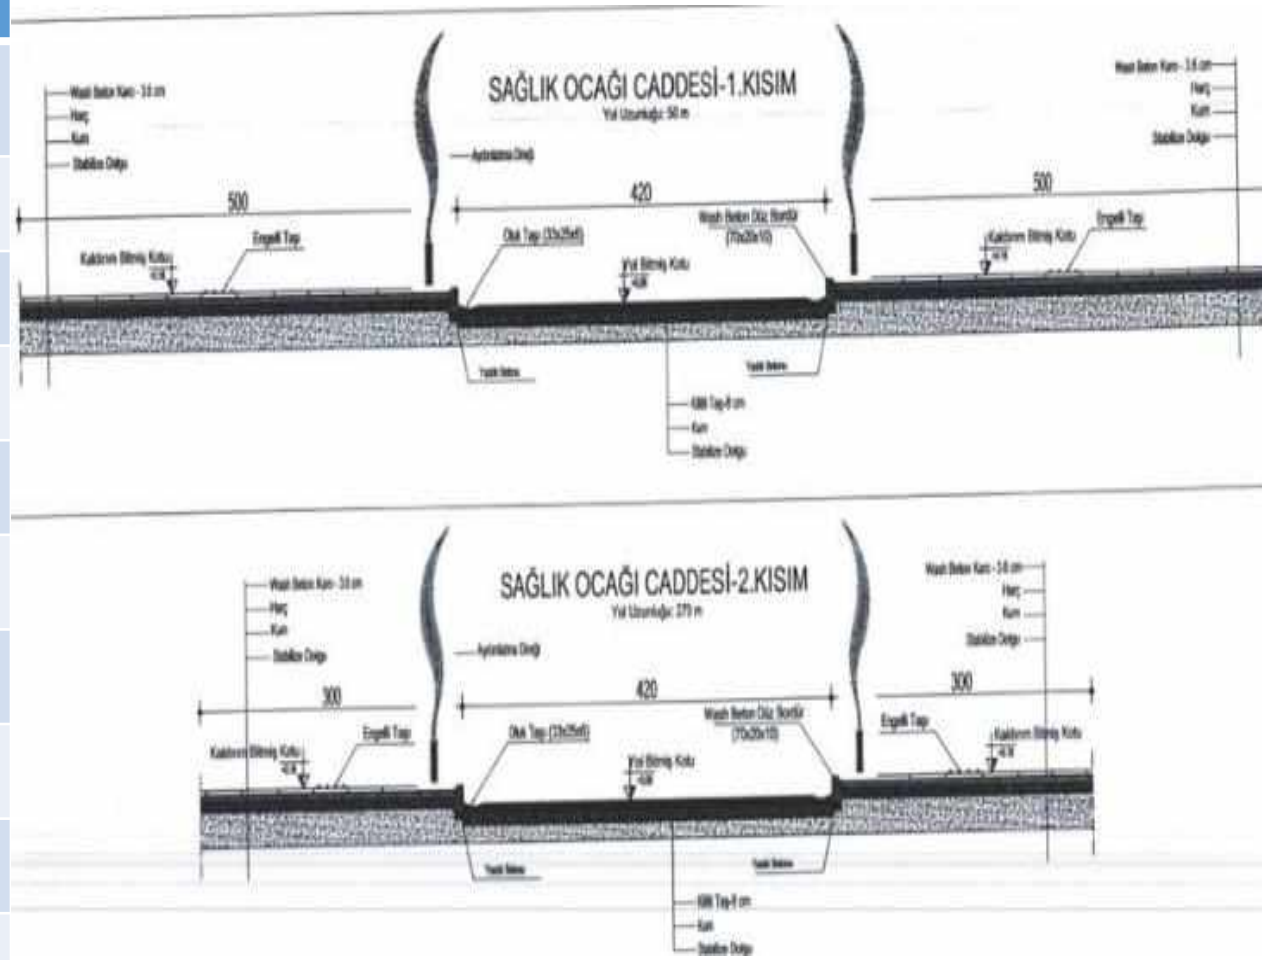

(2022_10) KUZEY ÇEVRE YOLU VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	16.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	16.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında





(2022_11) KAPALISPOR SALONU, BELEDİYE BİNASI, OTOGAR VE HAL YAPIM-ONARIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	3.383.377,50
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.383.377,50
Dönem Harcaması (TL)	1.722.817,74
Nakdi Gerçekleşme (%)	51,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	60,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor









(2022_12) AGREGA (YOL YAPIM MALZEMESİ) ALIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	8.920.800,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	8.920.800,00
Dönem Harcaması (TL)	1.167.708,93
Nakdi Gerçekleşme (%)	13,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	18,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2022_13) MUHTELİF YERLER KİLİTLİ PARKE ALIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2022
Proje Bedeli (TL)	3.351.200,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.351.200,00
Dönem Harcaması (TL)	1.216.875,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	36,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
