YATIRIMCI KURULUŞ İZLEME RAPORU

EKİM 2023

DÖNEM YATIRIM İCMALİ	
Toplam Proje Sayısı	44
Toplam Proje Bedeli (TL)	2.334.288.251
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	263.301.656
Yıl Ödeneği (TL)	2.070.986.595
Dönem Harcaması (TL)	187.710.735
Nakdi Gerçekleşme (%)	19,32%
Fiziki Gerçekleşme (%)	37,14%
Başlamayan Proje Sayısı	15
Devam Eden Proje Sayısı	16
Biten Proje Sayısı	5
Tasfiye Edilen Proje Sayısı	8

ADIYAMAN BELEDİYESİ

(2020_02) ADIYAMAN OTURAKÇILAR ÇARŞISI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	Turizm
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2020
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	6.489.412,16
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	5.097.870,27
Yıl Ödeneği (TL)	1.391.541,89
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	79,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	79,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor







(2020_20) MADAD PROJESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA GÜRLEVİK İÇME SUYU İSALE HATTI VE 20.000 M3'LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2021
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli - 8.880.026 EURO (TL)	260.539.991,01
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	105.929.803,52
Yıl Ödeneği - 8.880.026 EURO (TL)	154.610.187,49
Dönem Harcaması (TL)	39.649.307,19
Nakdi Gerçekleşme (%)	56,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	88,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor








(2022_01) ADIYAMAN BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	159.043.555,10
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	98.968.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	60.075.555,10
Dönem Harcaması (TL)	51.279.192,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	94,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	95,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2022_03) AYAKKABI KENT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	37.642.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	10.604.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	27.038.000,00
Dönem Harcaması (TL)	15.785.573,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	70,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	70,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

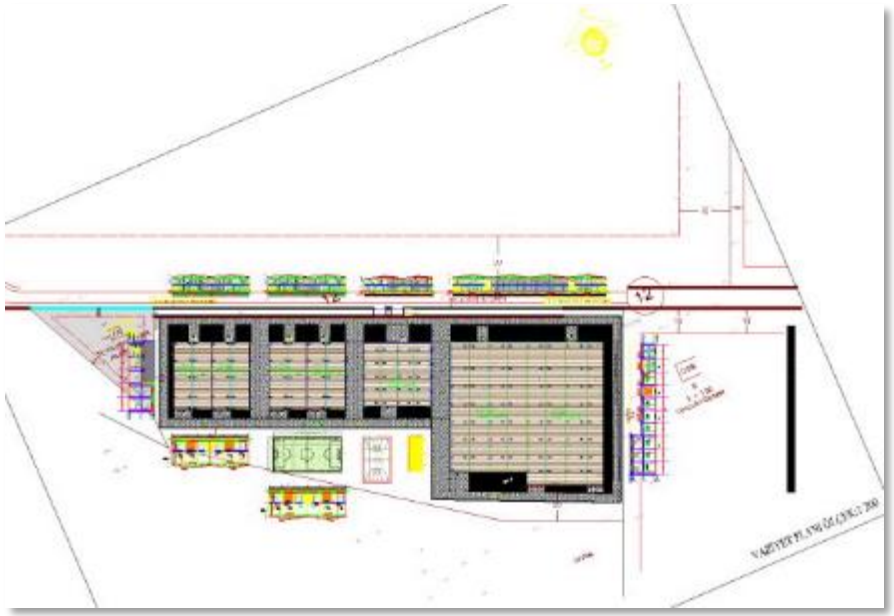



(2022_04) KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	236.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	601.216,00
Yıl Ödeneği (TL)	235.398.784,00
Dönem Harcaması (TL)	10.773.782,14
Nakdi Gerçekleşme (%)	5,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	5,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2022_05) HAYVAN PAZARI VE KESİMHANE YAPIM İŞİ	
Sektör	Tarım
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	60.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	25.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında




(2022_06) HAYVAN HASTANESİ VE GEÇİCİ HAYVAN BARINAĞI	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	28.961.920,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	5.346.051,00
Yıl Ödeneği (TL)	23.615.869,00
Dönem Harcaması (TL)	3.432.582,85
Nakdi Gerçekleşme (%)	30,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	30,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi






(2022_07) GÜNEY ÇEVRE YOLU VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	70.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	70.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

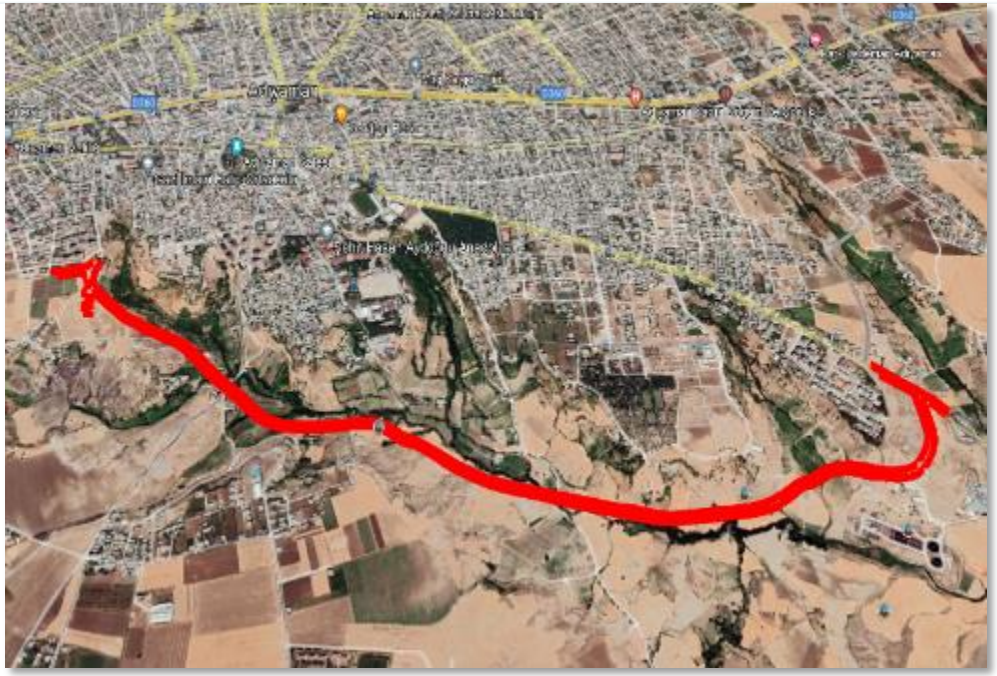



(2022_08) MUHTARLAR KONFEDERASYON BİNASI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	22.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	7.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

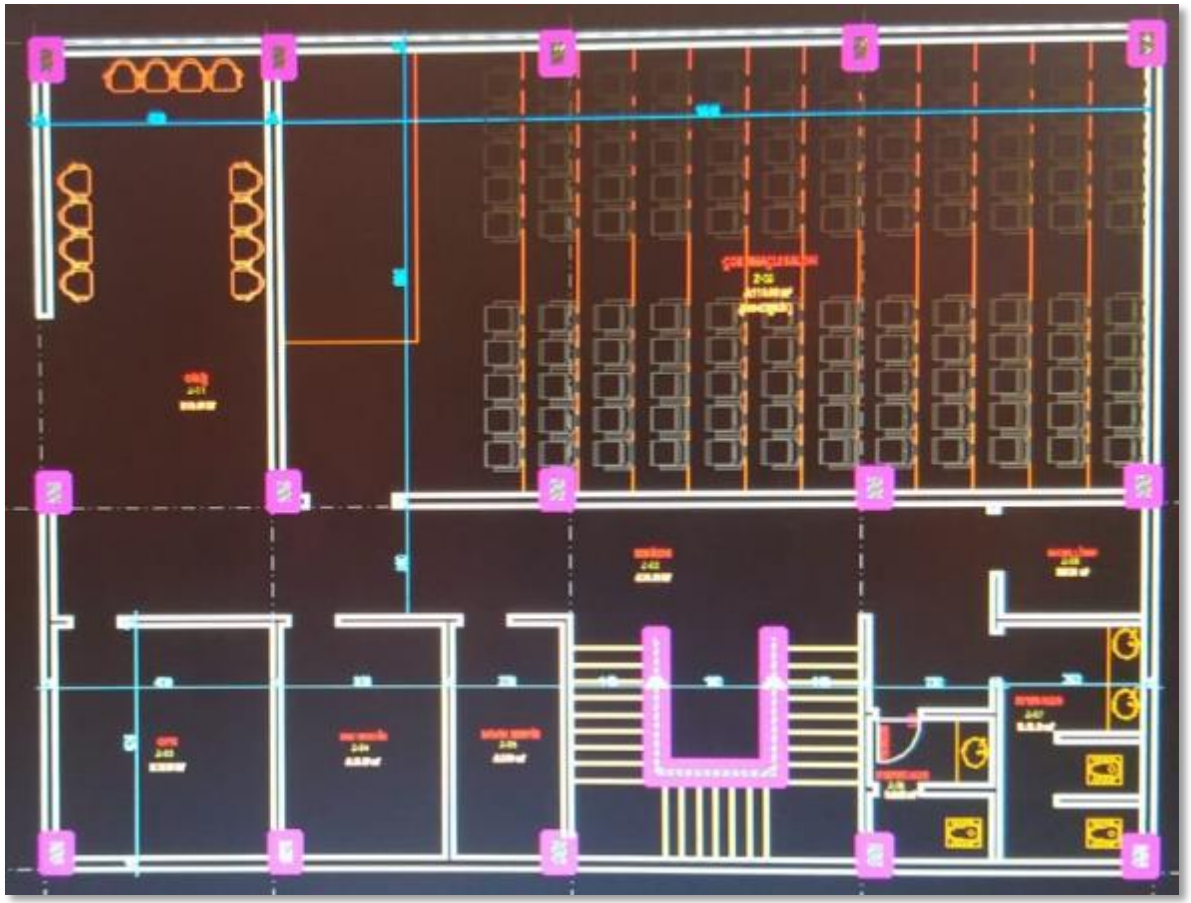

(2022_09) SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE YOL KALDIRIM AYDINLATMA YAPIM İŞİ (GÖLEBATMAZ CD, BUHARA CD. VE SAĞLIK OCAĞI CD.)	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	8.274.160,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	4.759.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.515.160,00
Dönem Harcaması (TL)	2.178.101,52
Nakdi Gerçekleşme (%)	84,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti






(2022_10) KUZEY ÇEVRE YOLU VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	40.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	16.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında





(2022_20) ADIYAMAN BELEDİYESİ EĞRİ ÇAYI KÖPRÜSÜ KAVŞAK-PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	4.026.302,92
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	464.434,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.561.868,92
Dönem Harcaması (TL)	2.257.861,41
Nakdi Gerçekleşme (%)	68,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	68,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi

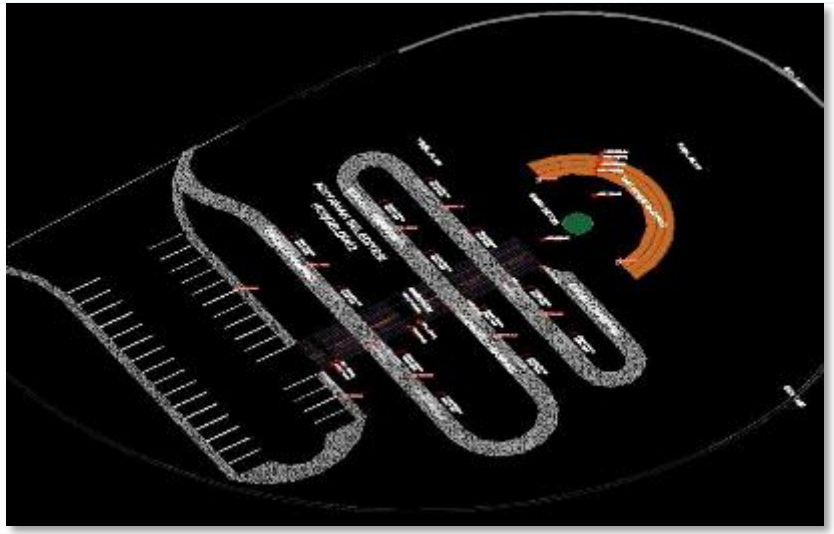



(2022_21) 33 ADET MUHTARLIK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	27.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	12.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2022_23) ADIYAMAN BELEDİYESİ TAŞ OCAKLARINDA PATLATMA HİZMETİ ALIM İŞİ	
Sektör	Madencilik
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	6.263.600,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	3.939.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	2.324.600,00
Dönem Harcaması (TL)	2.324.600,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2022_24) BAZALT KALDIRIM VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	10.323.063,59
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.479.571,00
Yıl Ödeneği (TL)	8.843.492,59
Dönem Harcaması (TL)	5.216.265,75
Nakdi Gerçekleşme (%)	65,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	65,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi





(2022_25) ADIYAMAN BELEDİYESİ ŞEHRİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA PARKE TAŞI DÖŞEME YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN BELEDİYESİ
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	16.240.132,32
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	3.803.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	12.437.132,32
Dönem Harcaması (TL)	3.382.925,06
Nakdi Gerçekleşme (%)	44,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	45,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi



(2022_26) İDARE MALI MALZEME İLE ASFALT SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	5.442.174,57
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	1.221.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.221.174,57
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	22,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	22,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi





(2022_28)ADIYAMAN 501 ADA 23 PARSEL BULUNAN KONAĞA AİT RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	Turizm
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	7.966.295,37
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	7.966.295,37
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	15,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor







(2022_29) TALAT PAŞA KONAĞI RESTORASYON YAPIM İŞİ	
Sektör	Turizm
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	8.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	8.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında







(2022_30) SAATTE 240 TON ÜRETİM KAPASİTELİ SABİT ASFALT PLENTİ VE İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	33.406.698,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	5.470.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	27.936.698,00
Dönem Harcaması (TL)	15.756.727,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	64,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2022_31) ADIYAMAN BELEDİYESİ VE SAMSAT, ÇELİKHAN, BALKAR BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLMEK ÜZERE KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	6.454.600,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	4.248.562,00
Yıl Ödeneği (TL)	2.206.038,00
Dönem Harcaması (TL)	2.206.038,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti


Balkar Belediyesi



Çelikhan Belediyesi



(2022_34) ADIYAMAN MERKEZ İÇMESUYU İNŞAATI (FRİT-II)	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2025
Proje Bedeli - 21.024.000 EURO	629.038.080,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği - 21.024.000 EURO	629.038.080,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	1,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor

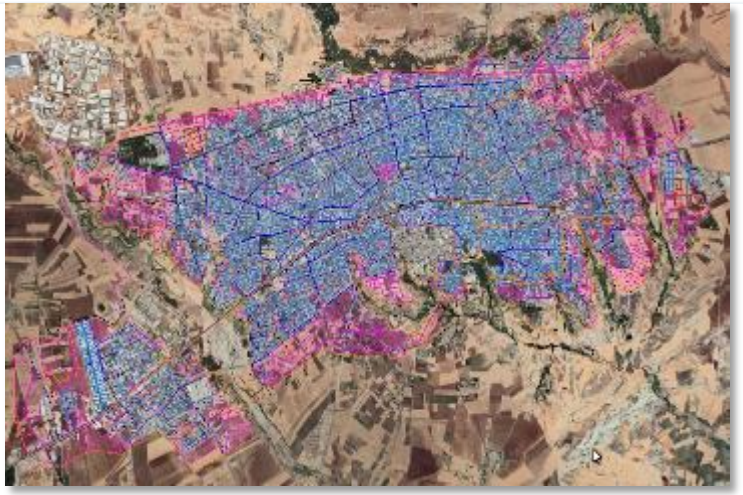



(2022_37) CUMHURİYET PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	4.307.124,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	934.000,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.373.124,00
Dönem Harcaması (TL)	2.243.875,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	74,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	75,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi



(2022_40) MUHTELİF ÇAPLARDA BORU SFERE KAPAK VE EK PARÇA ALIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	25.049.185,49
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	10.436.148,00
Yıl Ödeneği (TL)	14.613.037,49
Dönem Harcaması (TL)	14.613.037,49
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti





(2022_42) ALTINŞEHİR PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	3.181.366,31
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	3.181.366,31
Dönem Harcaması (TL)	2.182.054,82
Nakdi Gerçekleşme (%)	69,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	69,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi





(2022_43) MİLLİ MÜCADELE PARKI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	10.543.991,43
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	10.543.991,43
Dönem Harcaması (TL)	3.526.567,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	33,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor







(2022_44) GENÇLİK MERKEZİ SERT PEYZAJ YAPIM İŞİ (ESKİ ŞİRE PAZARI)	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	4.241.836,55
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.241.836,55
Dönem Harcaması (TL)	913.707,63
Nakdi Gerçekleşme (%)	22,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	22,00%
Yapım Durumu	Tasfiye Edildi



(2022_45) ÇELİK MENFEZ ALIMI VE MONTAJ İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2022
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	799.562,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	799.562,00
Dönem Harcaması (TL)	799.562,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%
Yapım Durumu	Bitti



(2023_01) ADIYAMAN BELEDİYESİ TAŞ OCAKLARI PATLATMA İŞİ	
Sektör	Madencilik
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	8.130.240,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	8.130.240,00
Dönem Harcaması (TL)	3.725.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	46,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	60,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2023_02) ŞEHRİN MUHTELİF SOKAK VE CADDELERİNDE KALDIRIM ONARIM VE YAPIM İŞİ	
Sektör	Ulaştırma - Haberleşme
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2024
Proje Bedeli (TL)	23.270.900,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	23.270.900,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	10,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor






(2023_03) ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇE ÖRENLİ MAHALLESİ (108 ADA 3-4-5-6-12-15-16 PARSELLER) GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	193.780.009,65
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	193.780.009,65
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2023_04) KARAPINAR MH. ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ SU BASMAN ALTYAPI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	2.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	2.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

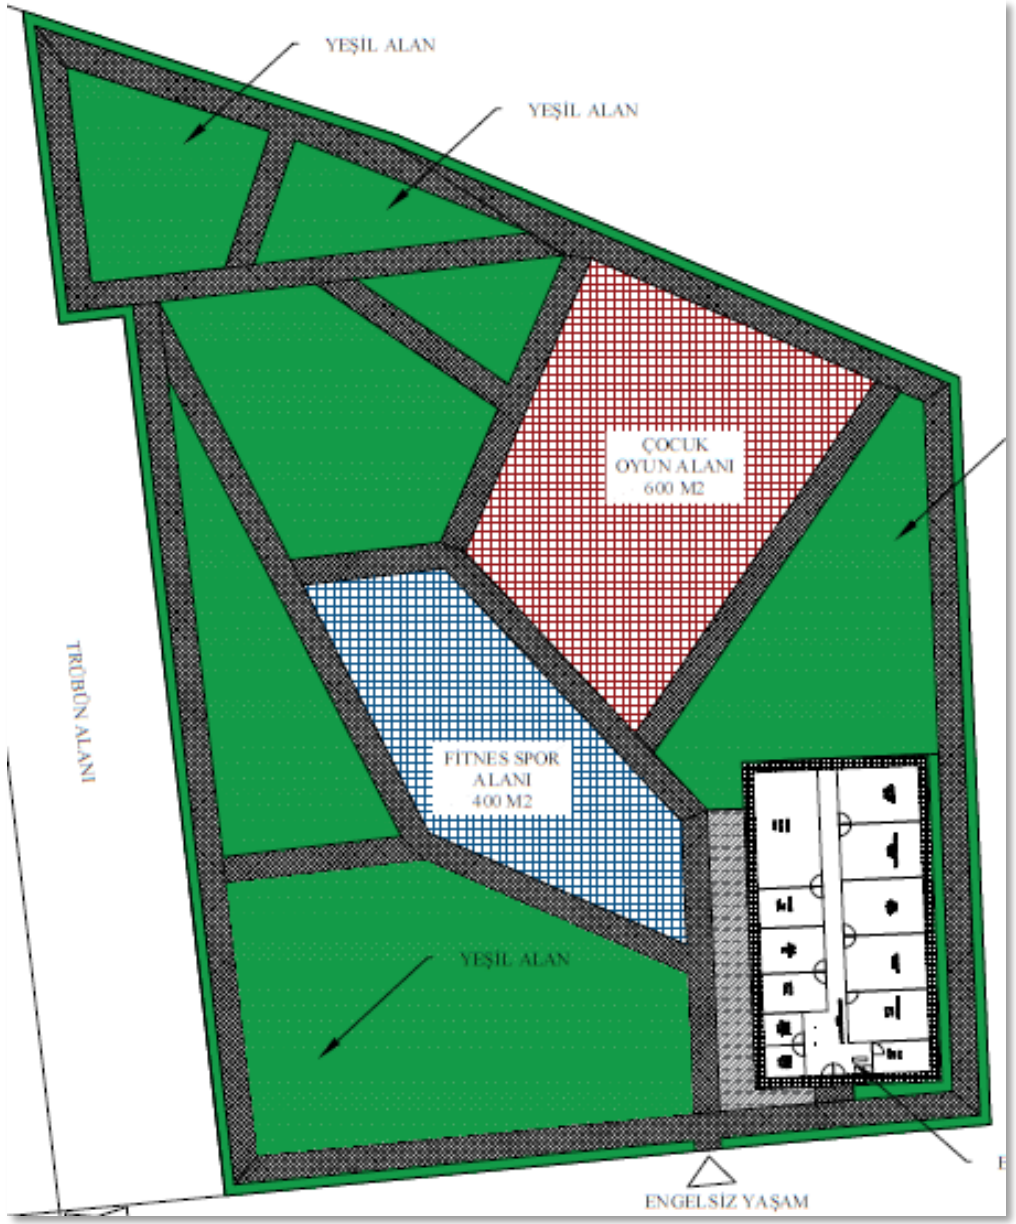


(2023_05) KENT PARK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	4.163.314,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.163.314,00
Dönem Harcaması (TL)	2.112.047,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	51,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	60,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor





(2023_06) ÇOCUK OYUN GURUBU ALIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	9.948.049,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	9.948.049,00
Dönem Harcaması (TL)	3.351.928,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	34,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



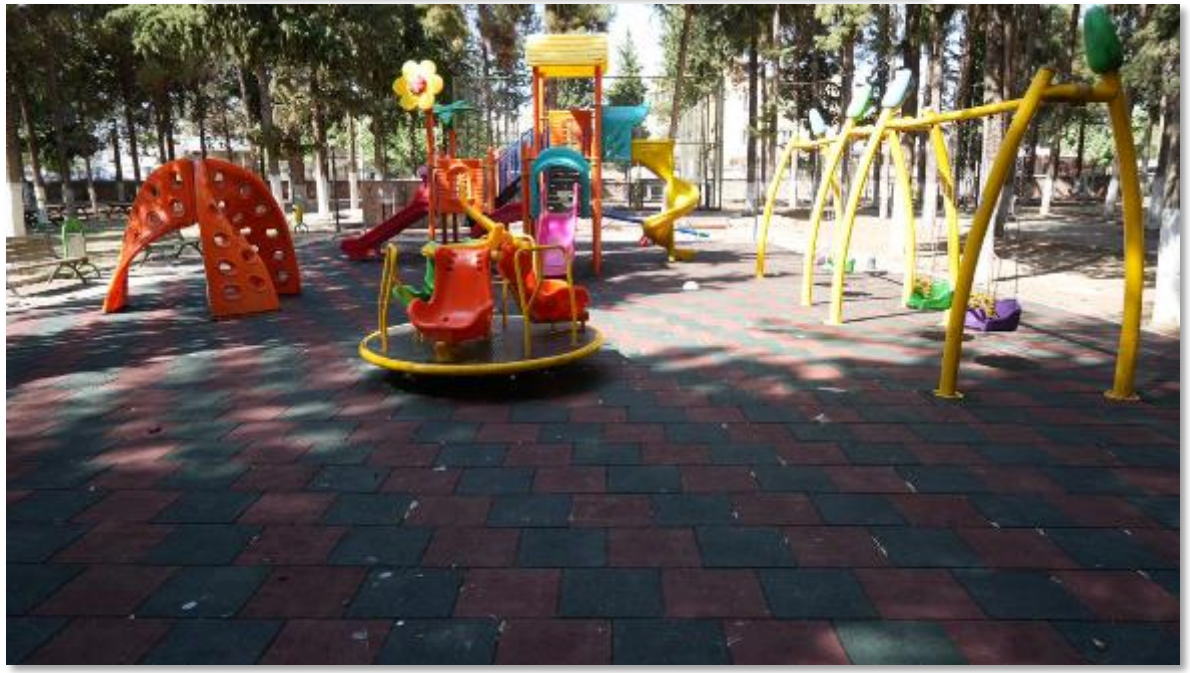

(2023_07) KELEŞ KONAĞI BAKIM-ONARIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN BELEDİYESİ
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	6.076.331,76
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	6.076.331,76
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	15,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor



(2023_08) TAZİYE EVLERİ BAKIM-ONARIM YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	1900
Bitiş Yılı	1900
Proje Bedeli (TL)	2.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	2.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında





(2023_09) ADIYAMAN KALESİ TADİLAT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	4.500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.500.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2023_10) ATATÜRK BULVARI FERFORJE KORKULUK YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	2023
Bitiş Yılı	2023
Proje Bedeli (TL)	4.184.355,60
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	4.184.355,60
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	30,00%
Yapım Durumu	Devam Ediyor




(2023_11) KARAPINAR MAHALLESİ KORU PARKI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	30.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	30.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2023_12) YENİ MAHALLE PRESTİJ KOOP. DOĞUSU PARKI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	20.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	20.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında




(2023_13) SÜMEREVLER MAHALLESİ GÖRKEM SİTESİ DOĞUSU PARKI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	15.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	15.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

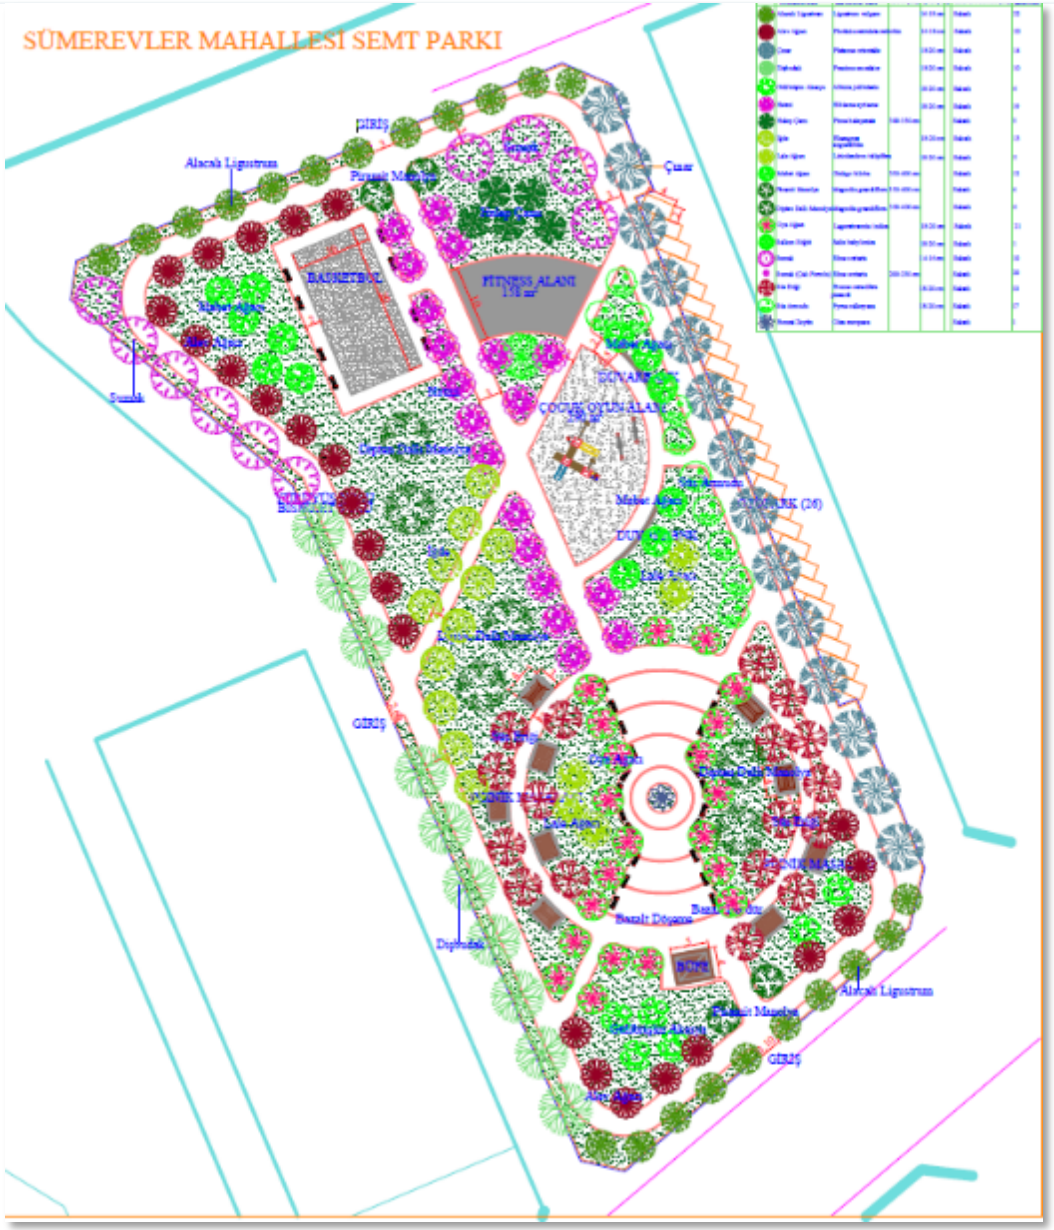


(2023_14) YENİ YAPILACAK MAHALLE PARKLARI (5 ADET) YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	20.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	20.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



(2023_15) SİTELER VE YUNUS EMRE MAHALLESİ PARKLARI VE YUNUS EMRE MAHALLESİ YÜRÜYÜŞ PARKI TADİLAT YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
Proje Yeri	ADIYAMAN
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	10.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	10.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında

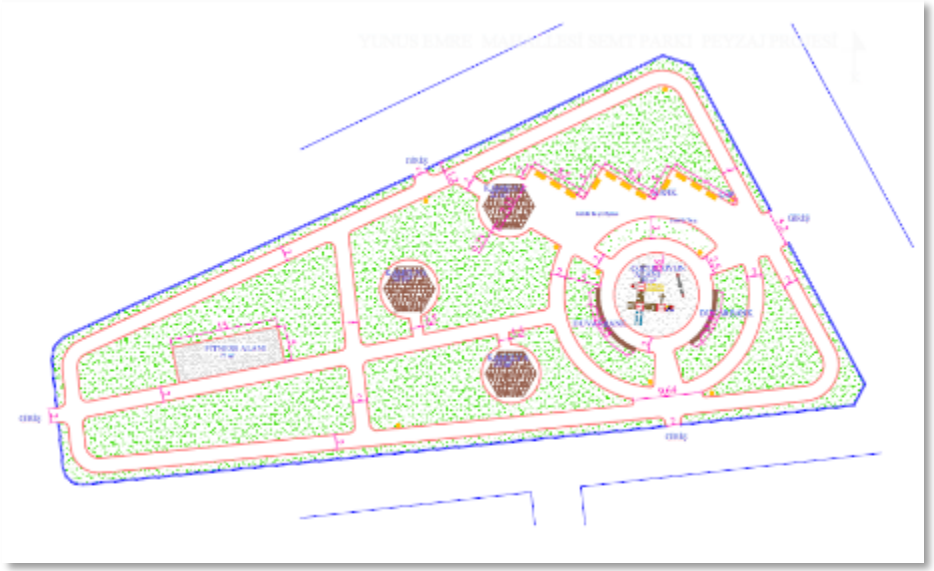

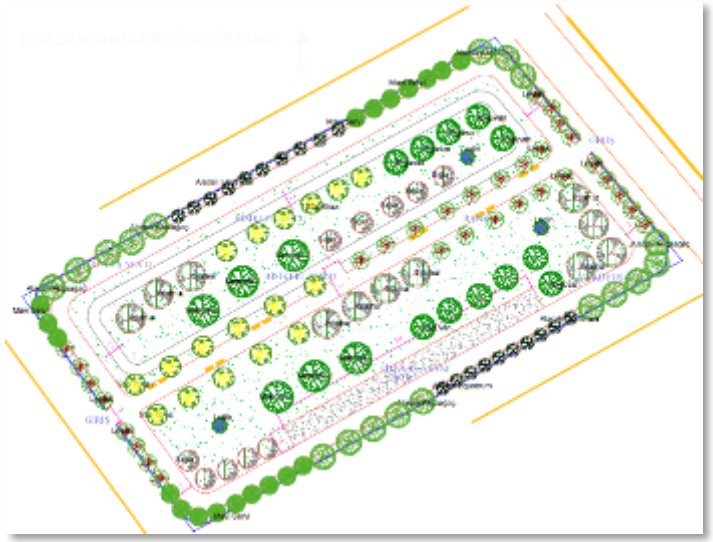

(2023_16) BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	
Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
Proje Yeri	ADIYAMAN BELEDİYESİ
Başlama Yılı	-
Bitiş Yılı	-
Proje Bedeli (TL)	250.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	0,00
Yıl Ödeneği (TL)	250.000.000,00
Dönem Harcaması (TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	0,00%
Yapım Durumu	İhale Aşamasında



YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İller Bankasından gönderilen sermaye payları ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle yapılan bütçe, şehrimize yapılması gereken makro projelerin gerçekleştirilmesine yeterli gelmemektedir.

Belediye olarak bizler misyon ve vizyonumuza uygun 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır proje ve yatırımları halkımıza sunabilmek için kaynak ihtiyacımız vardır.
